



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

A LA: Licda. Diana Polanco
Enc. División de Contabilidad

VIA: Lcdo. Tomas Emilio Duran Garden
Director General

Licdo. Marino Antonio Jimenez De La Cruz
Director Administrativo y Financiero

DEL: Departamento Fiscalización de Obras

ASUNTO: **SOLICITUD PAGO**

ANEXO: Cubicación, Copia Contrato, Presupuesto, fotos y Cheque

Por medio de la presente, solicitamos el pago de **UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 19/100 (RD\$1,686,331.19) CENTAVOS**, a favor de **NARKA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL**.

Este valor corresponde al reporte de la CUBICACION NO. 02 por concepto de **INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA GALLERA, LOS CHARAMICOS Y LA PIEDRA, MUNICIPIO SOSUA, Provincia Puerto Plata.**, según contrato No. 002/2023.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Muy Atentamente,

Juan Miguel Castillo R.
Enc. Ingeniería y Fiscalización
de Obras
CODIA No. 24960


Ing. Juan Miguel Castillo Rodriguez
Enc. Depto. De ingeniería y Fiscalización de Obras

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"



INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA GALLERA
OBRAS: LOS CHARAMICOS Y LA PIEDRA, MUNICIPIO SOSUA

CUBICACION NO.: 2
FECHA DE REALIZACION: 27 DE AGOSTO, 2025
CONTRATISTA: NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL.

Pág. 01/03

MONTO CONTRATADO: RDS\$4,105,183.65
EQUILIBRIO: RDS\$2,559,883.15
MONTO AVANCE: RDS\$21,036.73
NO. CONTRATO: 002/2023

PRESUPUESTO						CANTIDADES				COSTOS RDS		
CODIGO	DESCRIPCION	UND.	PRESUPUESTO	P. U. RDS	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1.0	RED DE AGUA POTABLE											
1.01	REPLANTEO (CON TOPÓGRAFO)	ML	981.00	84.40	82,796.40	697.39		697.39	71%	58,860.00	-	58,860.00
1.02	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA	PA	1.00	6,001.00	6,001.00							
	SUBTOTAL				88,797.40					58,860.00	-	58,860.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA:											
2.01	EXCAVACIÓN CON EQUIPO	M3	789.71	896.20	707,733.62	82.75	295.28	378.03	48%	74,163.60	264,629.94	338,793.54
2.02	ASIENTO DE ARENA DE 10 CM	M3	72.10	2,462.10	177,526.03	36.15	22.66	58.81	82%	88,996.32	55,791.19	144,787.51
2.03	BOTE DE MATERIAL	M3	140.38	721.65	101,304.18	24.94	76.11	101.05	72%	17,995.60	54,924.78	72,920.38
2.04	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICIÓN	M3	681.72	382.33	260,644.60	103.45	286.18	389.63	57%	39,553.92	109,415.20	148,969.12
	SUBTOTAL				1,247,208.43					220,709.44	484,761.10	705,470.54
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:											
3.01	TUBERÍA LINEA DE IMPULSION 6" PVC SCH-40 + 5% POR CAMP	ML	1,030.05	2,452.78	2,526,486.04	546.17	206.01	752.18	73%	1,339,623.12	505,297.21	1,844,920.33
3.02	TUBERÍA 6" HIERRO NEGRO + 5% POR CAMP	ML	2.00	22,500.00	45,000.00							
	SUBTOTAL				2,571,486.04					1,339,623.12	505,297.21	1,844,920.33
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES											
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø6" COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UD	3.00	24,977.99	74,933.97							
4.02	CONEXION O EMPALMES CON LINEAS EXISTENTES	PA	1.00	10,000.00	10,000.00							
4.03	INTERCONEXION A LINEA DE 20 PULG	PA	1.00	4,500.00	4,500.00							
	SUBTOTAL				89,433.97							
5.00	ASFALTO - TODO COSTO											
5.01	CORTE DE ASFALTO CON MAQUINA (E=4") AMBOS LADOS 0.70M		1,978.00	120.00	237,360.00	990.00	394.00	1384.00	70%	118,800.00	47,280.00	166,080.00
5.02	RIEGO DE ADHERENCIA		837.85	50.00	41,892.50	-						
5.03	COLOCACION DE HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE EN PLANTA		69.07	13,500.00	932,445.00	23.53	41.44	64.97	94%	317,722.00	559,440.00	877,162.00
5.04	COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE - TODO COSTO 4 PULG		69.07	1,850.00	127,779.50	17.92	41.44	59.36	86%	33,153.60	76,664.00	109,817.60
	SUBTOTAL				1,339,477.00					469,675.60	683,384.00	1,153,059.60
	TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO				5,336,402.84					2,088,868.162	1,673,442.311	3,762,310.473

E.G
4C
J. 882

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"



INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA GALLERA
OBRAS: LOS CHARAMICOS Y LA PIEDRA, MUNICIPIO SOSUA
CUBICACION NO.: 2
FECHA DE REALIZACION: 27 DE AGOSTO, 2025

CONTRATISTA: NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL

MONTO CONTRATADO: RDS\$4,105,183.65

EQUILIBRIO:

MONTO AVANCE: RDS\$821,036.73

NO. CONTRATO: 002/2023

			PRESUPUESTO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
SUB TOTAL GENERAL			RDS\$5,336,402.84	RDS\$2,088,868.16 ✓	1,673,442.311	RDS\$3,762,310.47
MAS:						
GASTOS INDIRECTOS						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%		RDS\$133,410.071	52,221.704	41,836.058 ✓	RDS\$94,057.76
HONORARIOS PROFESIONALES	10%		RDS\$533,640.284	208,886.816	167,344.231 ✓	RDS\$376,231.05
ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES	18%		RDS\$96,055.251	37,599.627	30,121.962 ✓	RDS\$67,721.59
SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS	2.00%		RDS\$106,728.06	41,777.363	33,468.846 ✓	RDS\$75,246.21
GASTOS DE TRANSPORTE	2.5%		RDS\$133,410.07	52,221.704	41,836.058 ✓	RDS\$94,057.76
LEY 6-86	1%		RDS\$53,364.03	20,888.682	16,734.423 ✓	RDS\$37,623.10
CODIA	0.1%		RDS\$5,336.40	2,088.868	1,673.442 ✓	RDS\$3,762.31
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RDS\$1,061,944.16	415,684.764 ✓	333,015.020	RDS\$748,699.784
IMPREVISTOS (SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACIÓN)	5.00%		RDS\$266,820.14			
TOTAL GENERAL			RDS\$6,665,167.15			
SUB-TOTAL CUBICADO						
				RDS\$2,504,552.9266	RDS\$2,006,457.3305	RDS\$4,511,010.2571
MENOS:						
AMORTIZACION DEL AVANCE		20%		RDS\$500,910.59	RDS\$320,126.14	RDS\$821,036.73
Porciento de avance						
			55%			
TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02						
				RDS\$2,003,642.34	RDS\$1,686,331.19	RDS\$3,689,973.53

PREPARADO POR:

ING. ELISMER GARCÍA MERCADO
ANALISTA DE COSTO

REVISADO POR:

ING. JUAN MIGUEL CASTILLO
ENC. DEPTO. INGENIERIA Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA:

JOHANNA JOSE SILVERIO DE LEON
NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL



APROBADO POR:


JOHANNES EMILIO DURÁN GARDÉN
DIRECTOR GENERAL







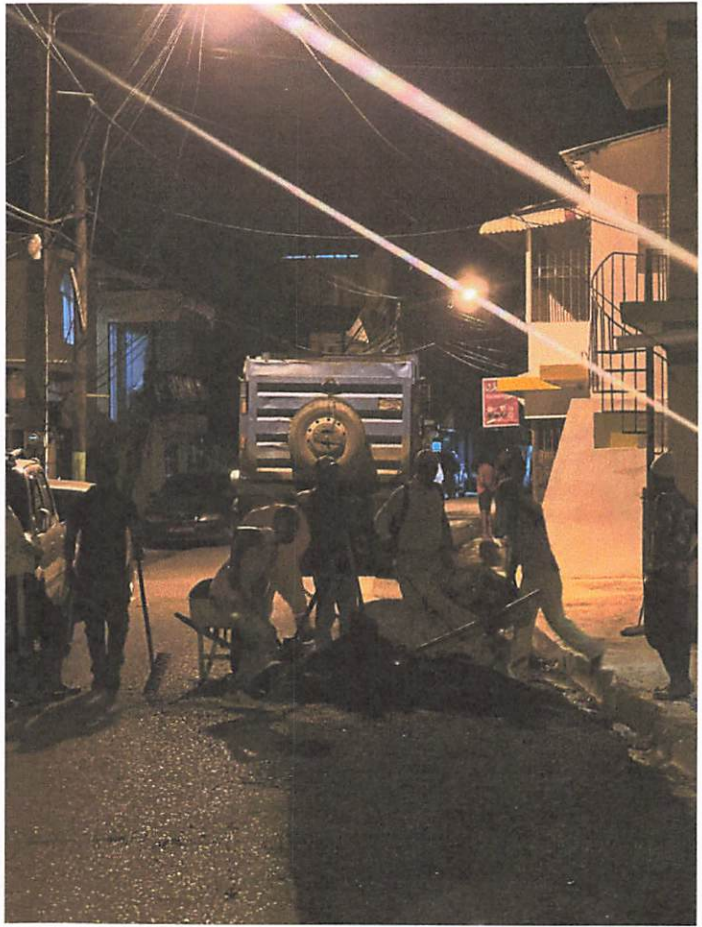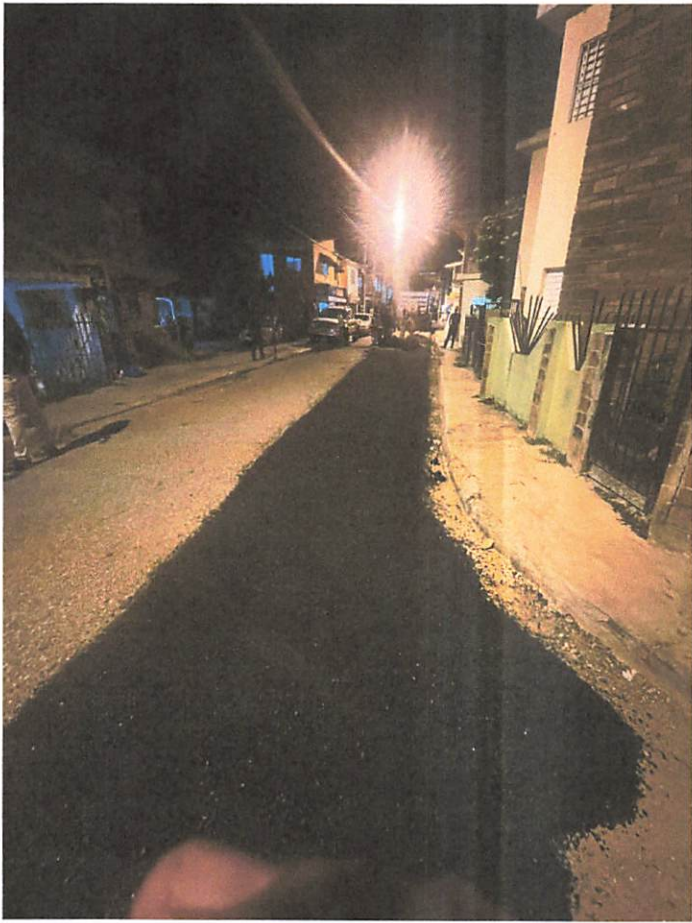

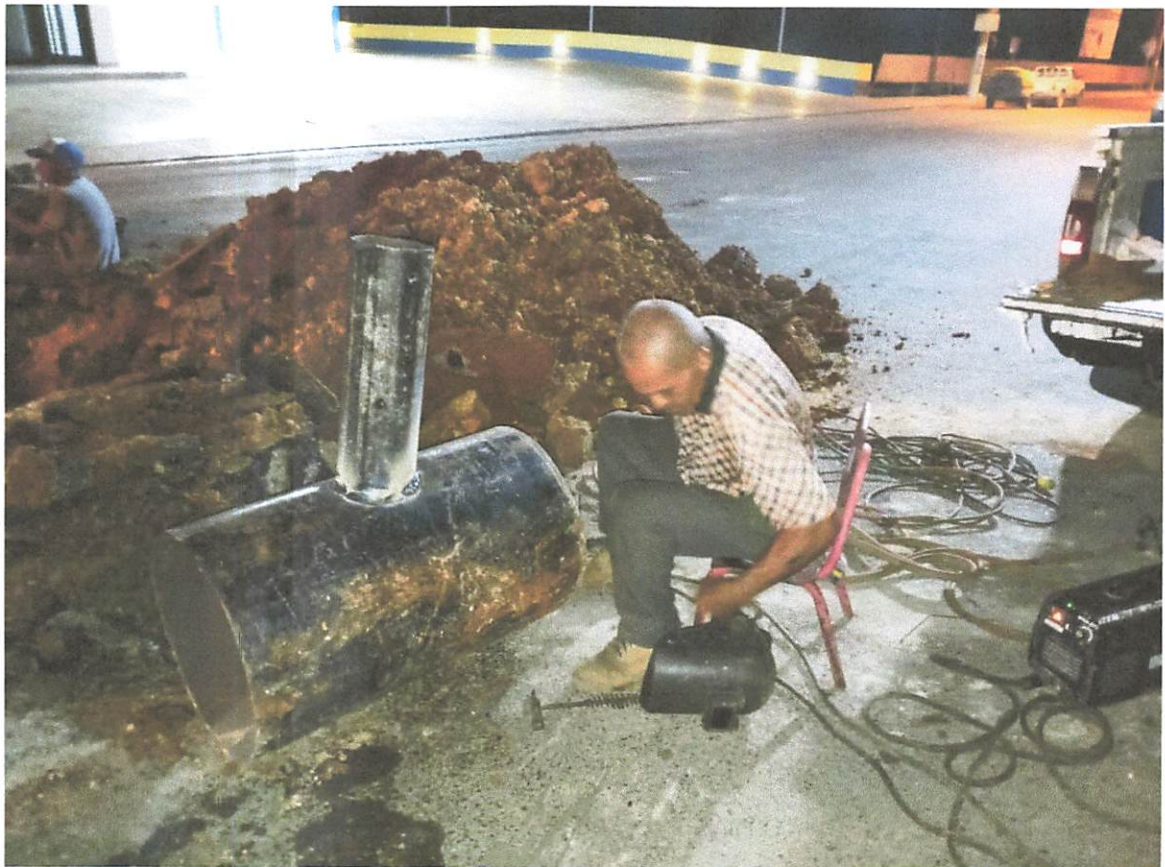



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

A LA: Licda. Diana Polanco
Enc. División de Contabilidad

VIA: Lcdo. Tomas Emilio Duran Garden
Director General

Licdo. Melvin Gomez Burgos
Director Administrativo y Financiero

DEL: Departamento De Ingeniería y Fiscalización de Obras

ASUNTO: **SOLICITUD PAGO**

ANEXO: Cubicación, Copia Contrato, Presupuesto, fotos y Cheque




Por medio de la presente, solicitamos el pago de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS DOMINICANOS CON 59/100 CENTAVOS (RD\$887,370.59)**, a favor de **QUACON SRL**.

Este valor corresponde al reporte de la CUBICACION NO. 03 por concepto de **AMPLIACION LINEA DE AGUA RESIDUALES CAMINO LOS LLIBRE, SOSUA, PUERTO PLATA., Provincia Puerto Plata.,** según contrato No. 008/2022.

Sin otro particular para su conocimiento y fines de lugar.

Muy Atentamente,

Juan Miguel Castillo R.
Enc. Ingeniería y Fiscalización
de Obras
CODIA No. 24960


Ing. Juan Miguel Castillo Rodriguez
Enc. Depto. De Ingeniería y Fiscalización de Obras

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



OBRAS: AMPLIACION AGUA RESIDUALES CAMINO LOS LLIBRE, SOSUA
CUBICACION NO.: 3

CONTRATISTA: QUACON, S.R.L.

MONTO CONTRATADO	RDS12,094,531.73
MONTO EQUILIBRIO	RDS3,857,369.24
MONTO AVANCE	RDS2,418,906.35
NO. CONTRATO	008/2022

PARTIDAS PRESUPUESTO						CANTIDADES				COSTOS RDS		
CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P. U. RDS	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
A	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO											
1.00	REPLANTEO (CON TOPOGRAFO)	ML	780.00	60.00	46,800.00	780.00	-	780.00	100.00%	46,800.00		46,800.00
1.02	MANEJO DEL TRNASITO	PA	1.00	100,000.00	100,000.00	0.90	0.10	1.00	100.00%	90,000.00	10,000.00	100,000.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA	PA	1.00	85,000.00	85,000.00	0.47	0.12	0.59	58.82%	40,000.00	10,000.00	50,000.00
	SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO				231,800.00					176,800.00	20,000.00	196,800.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.01	EXCAVACION CON EQUIPO	M3	861.90	995.14	857,710.73	221.42	13.36	234.78	27.24%	220,341.74	13,293.54	233,635.278
2.02	ASIENTO DE ARENA DE 10 CM	M3	69.62	2774.67	193,172.29	62.85	-	62.85	90.27%	174,374.89		174,374.890
2.03	BOTE DE MATERIAL	M3	142.00	863.76	122,653.92	61.39	6.41	67.80	47.75%	53,029.20	5,534.20	58,563.397
2.04	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION	M3	752.67	450.47	339,055.56	108.04	16.81	124.85	16.59%	48,670.81	7,570.83	56,241.644
	SUBTOTAL				1,512,592.50					496,416.64	26,398.57	522,815.21
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE											
3.01	TUBERIA PVC-SDR 26 12" +5% POR CAMP	ML	819.000	9,868.15	8,082,014.85	677.06	15.23	692.30	84.53%	6,681,352.00	150,330.42	6,831,682.42
	SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOC				8,082,014.85					6,681,352.00	150,330.42	6,831,682.42
4.00	ASFALTO-TODO COSTO											
4.01	CORTE DE ASFALTO CON MAQUINA (E=4") AMBOS LADOS	ML	1,576.000	360.88	568,740.10	1,309.67	-	1309.67	83.10%	472,634.12	-	472,634.12
4.02	RIEGO DE ADHERENCIA	M2	667.000	45.00	30,015.00	148.22	144.00	292.22	43.81%	6,670.00	6,480.00	13,150.00
4.03	SUMINISTRO DE HORMIGON EN CALIENTE EN PLANTA	M3	66.700	16,437.25	1,096,364.58	19.48	18.69	38.17	57.22%	320,160.00	307,200.00	627,360.00
4.04	COLOCACION CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE -TODO COSTO 4 PULG	M3	66.700	16,437.25	1,096,364.58	25.57	24.53	50.10	75.12%	420,288.91	403,275.72	823,564.63
	SUBTOTAL				2,791,484.25					1,219,753.03	716,955.72	1,936,708.75
5.00	CONFECCION REGISTROS 1@2 MTS CADA 100 ML											
5.01	REGISTRO FABRICADOS A MANO	UND.	9.00	45,865.60	412,790.40	7.35	-	7.35	81.64%	336,996.90		336,996.90
	SUBTOTAL CONFECCION				412,790.40					336,996.90		336,996.90
6.00	EMPALME A RED PRINCIPAL EN CARRETERA PUERTO PLATA/SOSUA											

6.01	PICADO DE CALLE, CONEXIÓN A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTRO Y CALLE	PA	1.00	85,000.00	85,000.00	1.00	-	1.00	100.00%	85,000.00		85,000.00
6.02	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	26.40	271.30	7,162.23	26.40	-	26.40	100.00%			
6.03	ASIENTO DE GRAVA DE 10 CM	M3	1.70	2,721.02	4,625.73	1.44	-	1.44	84.55%	3,911.13		3,911.13
6.04	BOTE DE MATERIAL	M3	2.21	863.76	1,908.91	1.06	-	1.06	47.81%	912.73		912.73
6.05	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION	M3	23.47	450.47	10,572.53	3.89	-	3.89	16.59%	1,754.07		1,754.07
	SUBTOTAL				109,269.40					91,577.93		91,577.93
A	SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO				13,139,951.38					9,002,896.50	913,684.71	9,916,581.21

ETM



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

"CORAAPPLATA"

OBRA: AMPLIACION AGUA RESIDUALES CAMINO LOS LLIBRE, SOSUA

CUBICACION NO.: 3

. DE REALIZACION: SEPTIEMBRE 12, 2025

CONTRATISTA: QUACON, S.R.L

MONTO CONTRATADO: RDS12,094,531.73

MONTO EQUILIBRIO RDS3,857,369.24

MONTO AVANCE: RDS2,418,906.35

NO. CONTRATO: 008/2022

	PRESUPUESTO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO	13,139,951.38	9,002,896.50	913,684.71	9,916,581.21

SUB-TOTAL GENERAL

MAS:

GASTOS INDIRECTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.50%	RDS459,898.298	RDS315,101.378	RDS31,978.9648	RDS347,080.342
HONORARIOS PROFESIONALES	10%	RDS1,313,995.138	RDS900,289.650	RDS91,368.471	RDS991,658.121
ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES	18%	RDS236,519.125	RDS162,052.137	RDS16,446.32	RDS178,498.462
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS	3.00%	RDS394,198.541	RDS270,086.895	RDS27,410.5412	RDS297,497.436
TRANSPORTE	2.0%	RDS262,799.028	RDS180,057.930	RDS18,273.6941	RDS198,331.624
LEY 6/86	1%	RDS131,399.514	RDS90,028.965	RDS9,136.85	RDS99,165.812
CODIA	0.1%	RDS13,139.951	RDS9,002.897	RDS913.68	RDS9,916.581

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RDS2,811,949.60	RDS1,926,619.851	RDS195,528.527	RDS2,122,148.378
-----------------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------

TOTAL GENERAL	RDS15,951,900.98
---------------	------------------

SUB-TOTAL CUBICADO	RDS10,929,516.351	RDS1,109,213.23	RDS12,038,729.586
--------------------	-------------------	-----------------	-------------------

MENOS:

AMORTIZACION DEL AVANCE	20%	RDS2,185,903.270	RDS221,842.647	RDS2,407,745.917
PORCENTAJE DE EJECUCION	75.5%			

TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02	RDS8,743,613.081	RDS887,370.59	RDS9,630,983.669
--------------------------------	------------------	---------------	------------------

REVISADO POR:

JUAN MIGUEL CASTILLO RODRIGUEZ

ENC. DEPTO. DE INGENIERIA Y FISCALIZACION DE OBRAS



CONTRATISTA:

LUIS TOMAS MATA MARTINEZ

QUACON, S.R.L



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

A LA: Licda. Diana
Enc. División de Contabilidad

VIA: Lcdo. Tomas Emilio Duran Garden
Director General

Lcdo. Marino Antonio Jimenez De La Cruz
Director Administrativo y Financiero

DEL: Departamento De Ingeniería Y Fiscalización de Obras

ASUNTO: **SOLICITUD PAGO**

ANEXOS: Cubicación, Copia Contrato, Presupuesto, fotos y Cheque



Por medio de la presente, solicitamos el pago de **QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON 19/100 (RD\$589,920.19)**, a favor de **LA ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO**.

Este valor corresponde al reporte de la CUBICACION NO. 04 por concepto de **AMPLIACION ACUEDUCTO LA CATALINA**, distrito municipal de sabaneta de Yásica, Provincia Puerto Plata, Republica Dominicana, según contrato No. 004/2022.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Muy Atentamente,

Juan Miguel Castillo R.
Enc. Ingeniería y Fiscalización
de Obras
CODIA No. 24960


Ing. Juan Miguel Castillo Rodriguez
Enc. Depto. De ingeniería y Fiscalización de Obras

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPLATA"

OBRAS: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LA CATALINA

MONTO CONTRATADO: RDS16,490,796.77

ADENDA: RDS3,394,338.58

TOTAL DE PRESUPUESTO + ADENDA: 19,885,135.35

MONTO AVANCE: RDS3,298,159.35

NO. CONTRATO: 004/2022

CUBICACION NO.: 4
FECHA DE REALIZACION: 29 de AGOSTO, 2025
CONTRATISTA: SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO

PARTIDAS PRESUPUESTO						CANTIDADES				COSTOS RDS		
CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P. U. RDS	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1.0	PRELIMINARES											
1.00	CASETA DE MATERIALES	UND	1.00	156,232.00	156,232.00	0.77	0.10	0.87	87%	119,638.67	15,623.20	135,261.87
1.02	PREPARACION DE CAMINO DE ACCESO	PA	1.00	374,544.00	374,544.00	0.27	0.19	0.46	46%	99,756.00	71,209.05	170,965.05
1.03	CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO PARA IDENTIFICACION	PA	1.00	32,028.00	32,028.00	0.47	0.15	0.62	62%	15,096.00	4,867.94	19,963.94
	SUBTOTAL PRELIMINARES				562,804.00					234,490.67	91,700.19	326,190.86
2.00	TRABAJO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA CATALINA											
2.01	LIMPIEZA GENERAL	PA	1.00	15,000.00	15,000.00	6.04	(5.04)	1.00	100%	90,600.00	(75,600.00)	15,000.00
2.02	BOTE DE ESCOMBROS	PA	1.00	45,000.00	45,000.00	0.33		0.33	33%	15,000.00	-	15,000.00
2.03	PINTURA EDIFICIO PLANTA DE TRATAMIENTO	PA	1.00	150,000.00	150,000.00	1.34	(0.34)	1.00	100%	201,500.00	(51,500.00)	150,000.00
2.04	REPARACION DE MALLA CICLONICA Y TRINCHERAS	ML	280.00	3,500.00	980,000.00	140.00		140.00	50%	490,000.00	-	490,000.00
2.05	LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO FOSA 1	UND	16.00	30,000.00	480,000.00	8.00		8.00	50%	240,000.00	-	240,000.00
2.06	LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO FOSA 2	UND	10.00	30,000.00	300,000.00	10.00		10.00	100%	300,000.00	-	300,000.00
2.07	LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO CISTERNA 1	UND	1.00	90,000.00	90,000.00	1.00		1.00	100%	90,000.00	-	90,000.00
2.08	LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO CISTERNA 2	UND	1.00	90,000.00	90,000.00	1.00		1.00	100%	90,000.00	-	90,000.00
2.09	REPARACION VALVULA DE GILLOTINA	UND	36.00	45,000.00	1,620,000.00	36.00		36.00	100%	1,620,000.00	-	1,620,000.00
2.10	REPARACION DE COMPUERTA	UND	36.00	20,000.00	720,000.00	31.53	4.47	36.00	100%	630,600.00	89,400.00	720,000.00
2.11	REPARACION Y MANTENIMIENTO BAÑOS	UND	1.00	10,000.00	10,000.00	1.00		1.00	100%	10,000.00	-	10,000.00
2.12	REPARACION Y MANTENIMIENTO PUERTAS	UND	1.00	6,000.00	6,000.00	1.00		1.00	100%	6,000.00	-	6,000.00
2.13	REPARACION Y MANTENIMIENTO VENTANAS	UND	1.00	15,000.00	15,000.00	1.00		1.00	100%	15,000.00	-	15,000.00
2.14	LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS	UND	1.00	90,000.00	90,000.00	1.00		1.00	100%	90,000.00		90,000.00
2.15	REPARACION Y MANTENIMIENTO LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES	UND	1.00	30,000.00	30,000.00	1.00		1.00	100%	30,000.00		30,000.00
2.16	LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO BARANDAS Y PASAMANOS	UND	1.00	45,000.00	45,000.00	1.00		1.00	100%	45,000.00		45,000.00
2.17	REPARACION Y MANTENIMIENTO POTAL ACCESO	UND	1.00	20,000.00	20,000.00	1.00		1.00	100%	20,000.00		20,000.00

E.G
AC
H

2.18	PERFORACION DE POZOS A ROTACION	PL	660.00	2,000.00	1,320,000.00	429.00		429.00	65%	858,000.00		858,000.00
2.19	HINCADO DE TUBERIAS DE 8"	PL	660.00	160.00	105,600.00	631.13		631.13	96%	100,980.00		100,980.00
2.20	RANURADO Y CORTE TUBERIAS	PL	660.00	210.00	138,600.00	660.00		660.00	100%	138,600.00		138,600.00
2.21	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 8" SDR-26	PL	660.00	590.00	389,400.00	660.00		660.00	100%	389,400.00		389,400.00
2.22	ANALISIS FISICO- QUIMICO Y BACTERIOLOGICO- AGUAS	UND	1.00	15,000.00	15,000.00	0.67		0.67	67%	10,000.00		10,000.00
2.23	INFORME TECNICO CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	UND	1.00	15,000.00	15,000.00	1.00		1.00	100%	15,000.00		15,000.00
2.24	SUMINISTRO DE AGUA PARA PERFORACION	PA	1.00	5,000.00	5,000.00	0.30		0.30	30%	1,500.00		1,500.00
2.25	PREPARACION BASE POZOS Y BURROS SOPORTES	UND	3.00	90,000.00	270,000.00	0.50		0.50	17%	45,000.00		45,000.00
2.26	AFORO DE POZOS	UND	3.00	120,000.00	360,000.00	2.25		2.25	75%	270,000.00		270,000.00
2.27	ALQUILER PLANTA 20KVA TRIFASICA	DIA	6.00	10,000.00	60,000.00			0.00	0%			-
	SUBTOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO LA CATALINA				7,384,600.00					5,735,680.00	13,800.00	5,749,480.00
3.00	TRABAJOS EXPLORACION Y PERFORACION POZOS CABARETE											
3.01	ANALISIS EXPLORACION GEOFISICA AGUAS SUBTARRANEAS ENTORNO	PA	1.00	90,000.00	90,000.00	1.00		1.00	100%		90,000.00	90,000.00
3.02	PERFORACION DE POZOS A ROTACION	PL	400.00	2,000.00000	800,000.00				0%		-	-
3.03	HINCADO DE TUBERIAS DE 10"	PL	400.00	175.00000	70,000.00				0%		-	-
3.04	RANURADO Y CORTES TUBERIAS	PL	400.00	210.00000	84,000.00				0%		-	-
3.05	SUMINISTRO DE TUBERIAS ACERO 10"	PL	400.00	1,950.00000	780,000.00	210.00		210.00	53%		409,500.00	409,500.00
3.06	ANALISIS FISICO- QUIMICO Y BACTERIOLOGICO - AGUAS	UND	1.00	15,000.00000	15,000.00	1.33	(0.33)	1.00	100%	20,000.00	(5,000.00)	15,000.00
3.07	ANALISIS FISICO- QUIMICO Y BACTERIOLOGICO Y RECOMENDACIONES	UND	1.00	30,000.00	30,000.00	1.00		1.00	100%	30,000.00	-	30,000.00
3.08	SUMINISTRO DE AGUA PARA PERFORACION	PA	1.00	5,000.00	5,000.00	0.60		0.60	60%	3,000.00	-	3,000.00
3.09	PERFORACION BASE DE POZOS Y BURROS SOPORTE	UND	4.00	90,000.00	360,000.00							
3.10	AFORO DE POZOS	UND	4.00	120,000.00	480,000.00							
3.11	ALQUILER PLANTA 20 KVA TRIFASICA	DIA	8.00	10,000.00	80,000.00							
3.12	BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 200 TDH PANEL D CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA	UND	4.00	316,333.59	1,265,334.36							
3.13	CHEQUE HORIZONTAL Ø6" PLATILLADO COMPLETO (PN10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	4.00	105,923.19	423,692.76							

E-G
JC
H.
M.AJ
J.M

3.14	VALVULAS DE COMPUERTA DE Ø6" COMPLETA (PN10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	4.00	57,375.00	229,500.00							
3.15	SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLD DE 6", INCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI.	UND	4.00	30,000.00	120,000.00							
3.16	CASETA ESTACION DE BOMBEO CERCO EN MALLA CICLONICA	UND	4.00	150,000.00	600,000.00							
3.17	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA Y BAJA TENSION	UND	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00							
	SUBTOTAL TRABAJOS EXPLORACION Y PERFORACION POZOS CABARETE				8,232,527.12					53,000.00	494,500.00	547,500.00
										6,099,670.67	600,000.19	6,699,670.86
	SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO				RDS16,179,931.12							

E.G
JC
H.
M.A.S
J.M



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"

Pág. 02/02

OBRAS: AMPLIACION ACUEDUCTO LA CATALINA

CUBICACION NO.: 4
FECHA DE REALIZACION: 29 de AGOSTO, 2025
CONTRATISTA: SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO

MONTO CONTRATADO: \$ 16,490,796.77
ADENDA: \$ 3,394,338.58
TOTAL DE PRESUPUESTO + ADENDA: \$ 19,885,135.35
MONTO AVANCE: \$ 3,298,159.35
NO. CONTRATO: 004/2022

		PRESUPUESTO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES		RDS16,179,931.12	RDS6,099,670.67	RDS600,000.19	RDS6,699,670.86
MAS:					
GASTOS INDIRECTOS					RDS200,990.13
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.0%	RDS485,397.93	RDS182,990.12	RDS18,000.01	
HONORARIOS PROFESIONALES	10%	RDS1,617,993.11	RDS609,967.07	RDS60,000.02	RDS669,967.09
ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES	18%	RDS291,238.76	RDS109,794.07	RDS10,800.00	RDS120,594.08
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS	4%	RDS647,197.24	RDS243,986.83	RDS24,000.01	RDS267,986.83
TRANSPORTE	3%	RDS485,397.93	RDS182,990.12	RDS18,000.01	RDS200,990.13
LEY 6/86	1%	RDS161,799.31	RDS60,996.71	RDS6,000.00	RDS66,996.71
CODIA	0.1%	RDS16,179.93	RDS6,099.67	RDS600.00	RDS6,699.67
SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS	23%	RDS3,705,204.23	RDS1,396,824.58	RDS137,400.04	RDS1,534,224.63
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO		RDS19,885,135.35	RDS7,496,495.25	RDS737,400.23	RDS8,233,895.49

MENOS:

AMORTIZACION DEL AVANCE	20%	RDS1,499,299.05	RDS147,480.05	RDS1,646,779.10
Porcentaje ejecutado	41%			
TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 04		RDS5,997,196.20	RDS589,920.19	RDS6,587,116.39

PREPARADO POR:
ING. ELISMER GARCÍA MERCADO
ANALISTA DE COSTO

REVISADO POR:
ING. JUAN MIGUEL CASTILLO
ENC. DEPTO. INGENIERIA FISCALIZACION DE OBRAS



CONTRATISTA:
SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
CED: 092 00121516
CODIA 20616

APROBADO POR:
TOMÁS EMILIO DÚRAN GARDEN
DIRECTOR GENERAL





AMPLIFICACION ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE LA CATALINA

FOTOS









**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

Puerto Plata, Rep. Dom.
Diciembre 17, 2025

AL : Licdo. Diana Polanco
Enc. División de Contabilidad

VIA : Licdo. Tomas Emilio Duran Garden
Director General

Licdo. Melvin Gomez Burgos
Director Administrativo y Financiero

DEL : Departamento Fiscalización de Obras

ASUNTO : **SOLICITUD PAGO**

ANEXOS : Cubicación, Copia: Contrato, Presupuesto, fotos y Cheque



Por medio de la presente, solicitamos el pago de **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES CON 76/100 (RD\$2,384,063.76)**, a favor **NAHBERT S.R.L (CUBICACION NO. 03)**, por concepto Ampliación acueductos Camú, Los Domínguez, Altos de Chavón y los Palomos, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata., según contrato No. 004/2022

Para su conocimiento y fines de lugar, muy Atentamente,

Ing. Juan Miguel Castillo Rodriguez
Enc. Depto. de ingeniería y Fiscalización de Obras



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillados de Puerto Plata
"CORAAAPPLATA"



OBRAS: AMPLIACION ACUEDUCTOS CAMU, LOS DOMINGUEZ, ALTOS DE CHAVON Y LOS PALOMOS
CUBICACION NO.: 2
FECHA DE REALIZACION: 7 DE OCTUBRE, 2024
CONTRATISTA: NABBERT S.R.L.

MONTO CONTRATADO: RD\$12,047,195.69
MONTO AVANCE: RD\$2,409,439.14
EQUILIBRIO ECONOMICO: RD\$3,426,086.90

NO. CONTRATO: 004/2022

COSTO CONTROL - 004/2021						CANTIDADES			COSTOS RDS			
CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P. U. RDS	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE CAMU												
A	PRELIMINARES											
1.00	INGENIERIA Y CAMPAMENTO	KM	1.00	57,031.82	57,031.82	-	0.75				42,773.87	42,773.87
	SUBTOTAL				57,031.82						42,773.87	42,773.87
REHABILITACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES												
1.00	DESAGUE DE 4" EN ACERO HN EN CANAL	ML	6	1,688.17	10,129.02	6.00		6.00	100%	10,129.02	-	10,129.02
2.00	PANETE EN SOPORTES DE CONCRETO	M2	18.05	335.9	6,063.00	18.05		18.05	100%	6,063.00	-	6,063.00
3.00	PANETE EN SEPARADORES DE SOPORTES	M2	15.5	335.9	5,206.45	15.50		15.50	100%	5,206.45	-	5,206.45
4.00	ARENA FINA DEL LECHO FILTRANTE	M3	18.2	9,775.00	177,905.00	18.20		18.20	100%	177,905.00	-	177,905.00
5.00	ARENA GRUESA DEL LECHO FILTRANTE	M3	18.2	9,775.00	177,905.00	18.20		18.20	100%	177,905.00	-	177,905.00
6.00	GRAVA DEL LECHO FILTRANTE	M3	18.2	1,350.00	24,570.00	18.20		18.20	100%	24,570.00	-	24,570.00
7.00	AGREGADO GRUESO DEL LECHO FILTRANTE	M3	18.2	2,400.00	43,680.00	18.20		18.20	100%	43,680.00	-	43,680.00
	SUBTOTAL				445,458.47					445,458.47	0.00	445,458.47
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS												
1.00	ESCALERA VERTICAL HIERRO 2 M DE H	UD	2	9,000.00	18,000.00		2.00	2.00	100%		18,000.00	18,000.00
2.00	ESCALERA VERTICAL ACERO INOXIDABLE 3M DE H	UD	2	45,900.00	91,800.00		1.00	1.00	50%		45,900.00	45,900.00
3.00	TAPA RECTANGULAR EN ACERO INOXIDABLE 1M X 1M	UD	1	10,000.00	10,000.00		1.00	1.00	100%		10,000.00	10,000.00
4.00	TUBO DE 6" DE ACERO HN	ML	3.5	3,549.74	12,424.09		2.50	2.50	71%		8,874.35	8,874.35
5.00	PORTAL DE HIERRO 4 M X 2 M (2 HOJAS)	UD	1	31,125.00	31,125.00		1.00	1.00	100%		31,125.00	31,125.00
6.00	PUERTA DE MADERA 2.10 M X 0.90 M	UD	1	12,500.00	12,500.00		1.00	1.00	100%		12,500.00	12,500.00
	SUBTOTAL				175,849.09						126,399.35	126,399.35
VALVULAS VASTAGO FIJO (SUMINISTRO Y COLOCACION)												
1.00	VALVULA VASTAGO FIJO 6"											
2.00	SUMINISTRO DE VALVULA DE 6"	UD	2.00	38,500.00	77,000.00		2.00	2.00	100%		77,000.00	77,000.00
3.00	INSTALACION	UD	2.00	2,000.00	4,000.00		2.00	2.00	100%		4,000.00	4,000.00
4.00	ABRAZADERA	UD	2.00	2,800.00	5,600.00		2.00	2.00	100%		5,600.00	5,600.00
5.00	NIPPLE DE 6"	UD	2.00	3,200.00	6,400.00		2.00	2.00	100%		6,400.00	6,400.00
	SUBTOTAL				93,000.00						93,000.00	93,000.00
VALVULAS VASTAGO FIJO 4"												
1.00	SUMINISTRO DE VALVULA DE 4"	UD	4.00	25,252.00	101,008.00		4.00	4.00	100%		101,008.00	101,008.00
2.00	INSTALACION	UD	4.00	2,000.00	8,000.00		4.00	4.00	100%		8,000.00	8,000.00
3.00	ABRAZADERA	UD	4.00	1,600.00	6,400.00		4.00	4.00	100%		6,400.00	6,400.00
4.00	NIPPLE DE 4"	UD	4.00	1,610.00	6,440.00		4.00	4.00	100%		6,440.00	6,440.00
	SUBTOTAL				121,848.00						121,848.00	121,848.00
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA												
1.00	PINTURA EPOXICA EN LECHO FILTRANTE	M2	118.98	345	41,048.10	118.98				41,048.10	-	41,048.10
2.00	PINTURA EPOXICA EN SEDIMENTADOR	M2	101.22	345	34,920.90	101.22				34,920.90	-	34,920.90
3.00	PINTURA ACRILICA EN CASETA DE CLORACION	M2	23.67	157.3	3,723.29	23.67				3,723.29	-	3,723.29

3.01	ESTACION DE BOMBEO INCLUYE BOMBAS, ELECTRIFICACION, CASETA Y CARCAMO DE BOMBEO	PA	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.50	0.50	100%	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	SUBTOTAL				2,000,000.00				1,000,000.00	-	1,000,000.00
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:										
4.01	TUBERIA LINEA DE 6" PVC SCH-40- 5% POR CAMPANA	ML	787.50	1,426.22		787.50	787.50	100%	1,123,148.25	-	1,123,148.25
	SUBTOTAL				1,123,148.25				1,123,148.25	-	1,123,148.25
5.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES										
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULAS DE COMPUERTA 06" COMPLETA (VASTAGO FID, ASIEN TO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	1.00	25,039.25					0.00	-	0.00
	SUBTOTAL			25,039.25	25,039.25				-	-	0.00
6.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 (6.37M X 6.07M X 3M)										
6.01	EXCAVACION CON EQUIPO 5.77M X 5.77M X 0.80M	M3	26.66	350		26.66	26.66	100%	9,331.00	-	9,331.00
6.02	RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO	ML	34.66	461.3		34.66	34.66	100%	15,988.66	-	15,988.66
6.03	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	M3	10.4	357.7		10.40	10.40	100%	3,720.08	-	3,720.08
6.04	LIMPIEZA BASE CISATERNA POR DERRUMBES SUELO	PA	1	6,000.00		1.00	1.00	100%	6,000.00	-	6,000.00
6.05	HORMIGON ARMADO EN FONDO H=0.30 M. (HORMIGON 240KG/CM2)	M3	11.5	18,420.00		11.50	11.50	100%	211,830.00	-	211,830.00
6.06	HORMIGON ARMADO PAREDES ANCHO =0.30 M. (HORMIGON 240KG/CM2)	M3	21.81	21,180.00		21.81	21.81	100%	461,935.80	-	461,935.80
6.07	HORMIGON ARMADO EN LOSA H=0.15 M. (HORMIGON 240KG/CM2)	M3	40.57	16,773.25		40.57	40.57	100%	680,490.75	-	680,490.75
6.08	FRAGUACHE	M2	102.53	73.99		102.53	102.53	100%	7,586.19	-	7,586.19
6.09	PANETE INTERIOR Y EXTERIOR PULIDO	M2	135.83	388.4		135.83	135.83	100%	52,756.37	-	52,756.37
6.10	CINTA WATER STOP DE 9"	ML	64	900		64.00	64.00	100%	57,600.00	-	57,600.00
6.11	PINTURA EN CISTERNA	M2	135.83	240.22		135.83	135.83	100%	32,629.08	-	32,629.08
6.12	ESCALERA	UND	2	20,884.50		2.00	2.00	100%	41,769.00	-	41,769.00
6.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA	UND	2	10,000.00		2.00	2.00	100%	20,000.00	-	20,000.00
6.14	PINTURA EXTERIOR	M2	50.77	228		50.77	50.77	100%	11,575.56	-	11,575.56
6.15	TUBERIA 6" ACHERO	ML	2	2,785.00		2.00	2.00	100%	5,570.00	-	5,570.00
6.16	SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULAS DE COMPUERTA 06" COMPLETA (VASTAGO FID, ASIEN TO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	6	25,039.25					0.00	-	0.00
6.17	TUBO DE VENTILACION	PA	1	3,000.00					0.00	-	0.00
6.18	CONO DE REBOSE	UND	1	3,500.00					0.00	-	0.00
6.19	CODO de 6" x 90 ACHERO	UND	3	1,950.00					0.00	-	0.00
6.20	SUBTOTAL				1,781,368.00				1,618,782.50	-	1,618,782.50
7.00	COLOCACION Y SUMINISTRO DE ASFALTO										
7.01	CORTE DE ASFALTO	ML	1,500.00	80		1,100.00	1,100.00	73%	88,000.00	-	88,000.00
7.02	REVOCION	M2	675	45					0.00	-	0.00
7.03	BOTE	M3	50.63	280					0.00	-	0.00
7.04	REPOSICION	M3	50.63	8,500.00					0.00	-	0.00
	SUBTOTAL				594,906.40				88,000.00	-	88,000.00
	SUB-TOTAL GENERAL				6,860,364.40						
1.00	TRABAJOS GENERALES										
1.01	LONGITUD TOTAL (REPLANTEO)	ML	190.00	50.00		190.00	190.00	100%	9,500.00	-	9,500.00
1.02	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA	PA	1.00	6,000.00		1.00	1.00	100%	6,000.00	-	6,000.00

1.02	BOTE	M3	11.68	56.49	659.86	11.68	11.68	100.00%	659.86	659.86
1.03	CONSTRUCCIÓN DE LOSA	M2	6.12	3,394.42	20,773.85	6.12	6.12	100.00%	20,773.85	20,773.85
1.04	FINO DE LOSA	M2	40.86	69.98	2,859.38	40.86	40.86	100.00%	2,859.38	2,859.38
				SUB-TOTAL	25,925.09				25,925.09	25,925.09
K	RECONSTRUCCIÓN D CASETA DE CLORACIÓN									
1.01	DEMOLICIÓN	M2	23.67	40.00	946.80	23.67	23.67	100.00%	946.80	946.80
1.02	BOTE	M3	6.15	56.49	347.44	6.15	6.15	100.00%	347.44	347.44
1.03	CONSTRUCCIÓN DE MURO	M2	18.61	210.09	3,909.77	18.61	18.61	100.00%	3,909.77	3,909.77
1.04	PANETE	M2	42.28	67.20	2,841.22	42.28	42.28	100.00%	2,841.22	2,841.22
1.05	LOSA	M3	0.61	3,394.42	2,070.60	0.61	0.61	100.00%	2,070.60	2,070.60
1.06	FINO DE LOSA	M2	5.06	69.98	354.10	5.06	5.06	100.00%	354.10	354.10
				SUB-TOTAL	10,469.93				10,469.93	10,469.93
	SUB-TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO CAMU				319,436.28				319,436.28	319,436.28

Estación de Bombeos Los Domínguez										
A	PRELIMINARES									
1.01	REPLANTEO (CON TOPOGRAFO)	ML	750.00	10.07	7,554.55	750.00	750.00	100.00%	7,554.55	7,554.55
				SUBTOTAL	7,554.55				7,554.55	7,554.55
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA									
2.01	EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA 19M X0.60M X 1.10M	M3	495.00	370.00	183,150.00	495.00	495.00	100.00%	183,150.00	183,150.00
2.02	ASIENTO DE ARENA DE 10 CM	M3	45.00	440.00	19,800.00	45.00	45.00	100.00%	19,800.00	19,800.00
2.03	BOTE DE MATERIAL	M3	87.75	62.12	5,451.36	87.75	87.75	100.00%	5,451.36	5,451.36
2.04	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICIÓN	M3	427.50	116.34	49,735.99	427.50	427.50	100.00%	49,735.99	49,735.99
				SUB-TOTAL	258,137.35				258,137.35	258,137.35
3.00	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BOMBEO									
3.01	ESTACIÓN DE BOMBEO INCLUYE BOMBAS, ELECTIFICACIÓN, CASETA Y CARCAMO DE BOMBEO	PA	0.50	400,000.00	200,000.00	0.50	0.50	100.00%	200,000.00	200,000.00
				SUB-TOTAL	200,000.00				200,000.00	200,000.00
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:									
4.01	TUBERÍA LÍNEA DE 6" PVC SCH-40 +5% POR CAMPANA	ML	787.50	285.14	224,547.75	787.50	787.50	100.00%	224,547.75	224,547.75
				SUBTOTAL	224,547.75				224,547.75	224,547.75
6.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 (6.37M X 6.07M X 3.00M)									
6.01	EXCAVACIÓN CON EQUIPO 5.77M X 5.77M X 0.80M	M3	26.66	69.73	1,859.04	26.66	26.66	100.00%	1,859.04	1,859.04
6.02	RELLENO DE REPOSICIÓN COMPACTADO	ML	34.66	92.29	3,198.72	34.66	34.66	100.00%	3,198.72	3,198.72
6.03	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	M3	10.40	71.58	744.41	10.40	10.40	100.00%	744.41	744.41
6.04	LIMPIEZA BASE CISTERNA POR DERRUMBES SUELO	PA	1.00	1,200.00	1,200.00	1.00	1.00	100.00%	1,200.00	1,200.00
6.05	HORMIGÓN ARMADO EN FONDO H=0.30M (HORMIGÓN 340 KG/CM2)	M3	11.50	3,684.17	42,367.96	11.50	11.50	100.00%	42,367.96	42,367.96
6.06	HORMIGÓN ARMADO EN PAREDES H=0.30M (HORMIGÓN 340 KG/CM2)	M3	21.81	4,236.51	92,398.28	21.81	21.81	100.00%	92,398.28	92,398.28

1.01	DEMOLICIÓN	M2	36.60	17.50	640.50	36.60	100.00%	640.50	640.50
1.02	BOTE	M3	4.76	56.49	268.92	4.76	100.00%	268.92	268.92
1.03	CONSTRUCCIÓN DE ACERA	M2	36.60	306.72	11,225.95	36.60	100.00%	11,225.95	11,225.95
SUB-TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE CAMU					101,678.82	0		101,678.82	101,678.82

Estación de Bombeos Los Domínguez									
A PRELIMINARES									
1.01	LIMPIEZA GENERAL	P.A	1.00	1,700.00	1,700.00	1.00	100.00%	1,700.00	1,700.00
SUB-TOTAL					1,700.00			1,700.00	1,700.00
3.00 CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BOMBEO									
3.01	ESTACIÓN DE BOMBEO INCLUYE BOMBAS ELECTRIFICACIÓN, CASETA Y CARCAMO DE BOMBEO	PA	0.50	400,000.00	200,000.00	0.50	100.00%	200,000.00	200,000.00
SUB-TOTAL					200,000.00			200,000.00	
5.00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES									
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTAS Ø6" COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	1.00	5,007.88	5,007.88	1.00	100.00%	5,007.88	5,007.88
SUB-TOTAL					5,007.88			5,007.88	5,007.88
6.00 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 (6.37M X 6.07M X 3.00M)									
6.16	SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULAS DE COMPUERTA Ø6" COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	6.00	5,007.88	30,047.28	6.00	100.00%	30,047.28	30,047.28
6.17	TUBO DE VENTILACION	PA	1.00	599.69	599.69	1.00	100.00%	599.69	599.69
6.18	CONO DE REBOSE	UND	1.00	699.54	699.54	1.00	100.00%	699.54	699.54
6.19	CODO de 6" x 90 ACERO	UND	3.00	390.43	1,171.29	3.00	100.00%	1,171.29	1,171.29
SUB-TOTAL					32,517.80			32,517.80	32,517.80
7.00 COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE ASFALTO									
7.01	CORTE DE ASFALTO	ML	400.00	16.40	6,560.00	400.00	100.00%	6,560.00	6,560.00
7.02	REMOCIÓN	M2	675.00	9.26	6,250.50	675.00	100.00%	6,250.50	6,250.50
7.03	BOTE	M3	50.63	56.00	2,835.28	50.63	100.00%	2,835.28	2,835.28
7.04	REPOSICION	M3	50.63	1,700.10	86,076.06	50.63	100.00%	86,076.06	86,076.06
SUB-TOTAL ESTACION DE BOMBEO LOS DOMINGUEZ					101,721.84	0		101,721.84	101,721.84
SUB-TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE CAMU					340,947.52	0		340,947.52	340,947.52

Línea de Impulsión Sabana Grande

TRABAJOS GENERALES									
1.00	LONGITUD TOTAL (REPLANTEO)		ML	190.00	10.07	1,913.82	190.00	100.00%	1,913.82
1.01						1,200.00	1.00	100.00%	1,200.00
1.02	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA		PA	1.00	SUB-TOTAL	3,113.82			3,113.82
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES								
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø2' COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 2". JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	1.00	2,299.63		2,299.63	1.00	100.00%	2,299.63
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø3' COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 3". ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	3.00	3,633.90		10,901.70	3.00	100.00%	10,901.70
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø4' COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 4". ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UND	1.00	5,049.54		5,049.54	1.00	100.00%	5,049.54
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION TAPON DE PVC DE 4" ANCLADO CON HORMIGON SIMPLE	PA	1.00	50.69		50.69	1.00	100.00%	50.69
4.05	EMPALMES CON LINEAS EXISTENTES	PA	2.00	880.24		1,760.48	2.00	100.00%	1,760.48
6.00	ELECTROMECHANICO			SUB-TOTAL		20,062.04			20,062.04
6.01	ELECTROBOMBAS COMPLETAS DE 125 GPM VS 170" TDH INCLUYE, VÁLVULAS, MANYFORD ENTRE OTROS ELEMENTOS.	UND	1.00	49,999.69		49,999.69	1.00	100.00%	49,999.69
6.02	TRABAJO ELECTROMECHANICOS GENERAL Y CONEXIÓN A LA RED INCLUYE LINEA CON POSTE ELECTRICO, PANEL, BAJA TENSION, ENTRE OTROS ELEMENTOS.	PA	1.00	15,400.18		15,400.18	1.00	100.00%	15,400.18
SUBTOTAL LINEA DE IMPULSION SABANA GRANDE						65,399.87			65,399.87
SUBTOTAL PARTIDAS PENDIENTES DE CUBICAR						531,202.07			531,202.07
SUBTOTAL GENERAL						11,971,284.20			11,971,284.20
						7,326,074.42			7,326,074.42
						2,464,912.90			2,464,912.90
						531,202.07			531,202.07
						9,790,987.31			9,790,987.31

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"



OBRAS: AMPLIACIÓN ACUEDUCTOS CAMÚ, LOS DOMINGUEZ, ALTOS DECHAVÓN Y LOS PALOMOS
CUBICACION NO.: 2
FECHA DE REALIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE, 2025
CONTRATISTA: NAHBERT S.R.L.

MONTO CONTRATADO: RDS12,047,195.69
MONTO AVANCE: RDS2,409,439.14
EQUILIBRIO ECONÓMICO RDS2,426,086.90
NO. CONTRATO: 004/2022

PRESUPUESTO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
RDS11,971,284.20	7,326,074.42	2,464,912.899	RDS9,790,987.31

GASTOS INDIRECTOS	%	11,971,284.20	RDS359,138.53	RDS19,782.23	RDS73,947.39	RDS293,729.62
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	11,971,284.20	RDS1,197,128.42	RDS732,607.44	RDS246,491.29	RDS979,098.73
HONORARIOS PROFESIONALES	18%	1,197,128.42	RDS115,483.12	RDS131,869.34	RDS44,588.43	RDS176,237.77
ITRIS A HONORARIOS PROFESIONALES	3.00%	11,971,284.20	RDS359,138.53	RDS19,782.23	RDS73,947.39	RDS293,729.62
SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS	2.00%	11,971,284.20	RDS239,425.68	RDS146,521.49	RDS49,298.26	RDS195,819.75
GASTOS DE TRANSPORTE	1%	11,971,284.20	RDS119,712.84	RDS73,360.74	RDS24,649.13	RDS97,909.87
CODIA	0.1%	11,971,284.20	RDS11,971.28	RDS7,326.07	RDS2,464.91	RDS9,790.99

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RDS2,501,998.39	RDS1,531,149.55	RDS515,166.80	RDS2,046,316.35
-----------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

TOTAL GENERAL	RDS14,473,282.59
---------------	------------------

SUB-TOTAL CUBICADO	RDS8,857,223.9680	RDS2,980,079.6944	RDS11,837,303.6624
--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

AMORTIZACIÓN DEL AVANCE	20%	RDS1,771,444.8	RDS596,015.94	RDS2,367,460.73
-------------------------	-----	----------------	---------------	-----------------

PORCENTAJE DE EJECUCION	81.75%
-------------------------	--------

TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01	RDS7,085,779.17	RDS2,384,063.76	RDS9,469,842.93
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

CONTRATISTA
RAFAEL LEONIDAS DIAZ CUESTA
NAHBERT S.R.L.



JUAN MIGUEL CASTILLO RODRIGUEZ
ENCAGADO DE INGENIERIA Y FISCALIZACION







