



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
INFORME DE PRESUPUESTO SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Trimestre Enero – Marzo 2026.**

Muy Atentamente,

Ing. Luis Villa Batista
Encargado de Fiscalización y Supervisión





**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

A LA: Licda. Diana Polanco
Enc. División de Contabilidad

VIA: Lcdo. Tomas Emilio Duran Garden
Director General

Lcdo. Marino Antonio Jimenez De La Cruz
Director Administrativo y Financiero

DEL: Departamento Fiscalización de Obras

ASUNTO: **SOLICITUD PAGO**

ANEXO: Cubicación, Copia Contrato, Presupuesto, fotos y Cheque




Por medio de la presente, solicitamos el pago de **UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 19/100 (RD\$1,686,331.19) CENTAVOS**, a favor de **NARKA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL**.

Este valor corresponde al reporte de la CUBICACION NO. 02 por concepto de **INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA GALLERA, LOS CHARAMICOS Y LA PIEDRA, MUNICIPIO SOSUA, Provincia Puerto Plata.**, según contrato No. 002/2023.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Muy Atentamente,

Juan Miguel Castillo R.
Enc. Ingeniería y Fiscalización
de Obras
CODIA No. 24960


Ing. Juan Miguel Castillo Rodriguez
Enc. Depto. De ingeniería y Fiscalización de Obras

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"

Pág. 01/03



INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA GALLERA
OBRAS: LOS CHARAMICOS Y LA PIEDRA, MUNICIPIO SOSUA

CUBICACION NO.: 2
FECHA DE REALIZACION: 27 DE AGOSTO, 2025
CONTRATISTA: NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL.

MONTO CONTRATADO: RDS4,105,183.65
EQUILIBRIO: RDS2,559,883.15
MONTO AVANCE: RDS821,036.73
NO. CONTRATO: 002/2023

CODIGO	DESCRIPCION	UND.	PRESUPUESTO			CANTIDADES				COSTOS RDS		
			PRESUPUESTO	P. U. RDS	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1.0	RED DE AGUA POTABLE											
1.01	REPLANTEO (CON TOPÓGRAFO)	ML	981.00	84.40	82,796.40	697.39		697.39	71%	58,860.00	-	58,860.00
1.02	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA	PA	1.00	6,001.00	6,001.00							
	SUBTOTAL				88,797.40					58,860.00	-	58,860.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA:											
2.01	EXCAVACIÓN CON EQUIPO	M3	789.71	896.20	707,733.62	82.75	295.28	378.03	48%	74,163.60	264,629.94	338,793.54
2.02	ASIENTO DE ARENA DE 10 CM	M3	72.10	2,462.10	177,526.03	36.15	22.66	58.81	82%	88,996.32	55,791.19	144,787.51
2.03	BOTE DE MATERIAL	M3	140.38	721.65	101,304.18	24.94	76.11	101.05	72%	17,995.60	54,924.78	72,920.38
2.04	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICIÓN	M3	681.72	382.33	260,644.60	103.45	286.18	389.63	57%	39,553.92	109,415.20	148,969.12
	SUBTOTAL				1,247,208.43					220,709.44	484,761.10	705,470.54
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:											
3.01	TUBERÍA LINEA DE IMPULSION 6" PVC SCH-40 - 5% POR CAMP	ML	1,030.05	2,452.78	2,526,486.04	546.17	206.01	752.18	73%	1,339,623.12	505,297.21	1,844,920.33
3.02	TUBERÍA 6" HIERRO NEGRO + 5% POR CAMP	ML	2.00	22,500.00	45,000.00							
	SUBTOTAL				2,571,486.04					1,339,623.12	505,297.21	1,844,920.33
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES											
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA 06" COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS)	UD	3.00	24,977.99	74,933.97							
4.02	CONEXION O EMPALMES CON LINEAS EXISTENTES	PA	1.00	10,000.00	10,000.00							
4.03	INTERCONEXION A LINEA DE 20 PULG	PA	1.00	4,500.00	4,500.00							
	SUBTOTAL				89,433.97							
5.00	ASFALTO - TODO COSTO											
5.01	CORTE DE ASFALTO CON MAQUINA (E-4") AMBOS LADOS 0.70M		1,978.00	120.00	237,360.00	990.00	394.00	1384.00	70%	118,800.00	47,280.00	166,080.00
5.02	RIEGO DE ADHERENCIA		837.85	50.00	41,892.50							
5.03	COLOCACION DE HORMIGÓN ASFALTICO EN CALIENTE EN PLANTA		69.07	13,500.00	932,445.00	23.53	41.44	64.97	94%	317,722.00	559,440.00	877,162.00
5.04	COLOCACION CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE - TODO COSTO 4 PULG		69.07	1,850.00	127,779.50	17.92	41.44	59.36	86%	33,153.60	76,664.00	109,817.60
	SUBTOTAL				1,339,477.00					469,675.60	683,384.00	1,153,059.60
	TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO				5,336,402.84					2,088,868.162	1,673,442.311	3,762,310.473

E.G
A.C.
J.P.

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"



INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA GALLERA
OBRAS: LOS CHARAMICOS Y LA PIEDRA, MUNICIPIO SOSUA
CUBICACION NO.: 2
FECHA DE REALIZACIÓN: 27 DE AGOSTO, 2025

CONTRATISTA: NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL

MONTO CONTRATADO: RDS4,105,183.65
EQUILIBRIO:
MONTO AVANCE: RDS821,036.73
NO. CONTRATO: 002/2023

SUB TOTAL GENERAL		PRESUPUESTO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
		RDS5,336,402.84	RDS2,088,868.16	1,673,442.311	RDS3,762,310.47
MAS:					
GASTOS INDIRECTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%	RDS133,410.071	52,221.704	41,836.058	RDS94,057.76
HONORARIOS PROFESIONALES	10%	RDS533,640.284	208,886.816	167,344.231	RDS376,231.05
ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES	18%	RDS96,055.251	37,599.627	30,121.962	RDS67,721.59
SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS	2.00%	RDS106,728.06	41,777.363	33,468.846	RDS75,246.21
GASTOS DE TRANSPORTE	2.5%	RDS133,410.07	52,221.704	41,836.058	RDS94,057.76
LEY 6-86	1%	RDS53,364.03	20,888.682	16,734.423	RDS37,623.10
CODIA	0.1%	RDS5,336.40	2,088.868	1,673.442	RDS3,762.31
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		RDS1,061,944.16	415,684.764	333,015.020	RDS748,699.784
IMPREVISTOS (SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACIÓN)	5.00%	RDS266,820.14			
TOTAL GENERAL		RDS6,665,167.15			
SUB-TOTAL CUBICADO			RDS2,504,552.9266	RDS2,006,457.3305	RDS4,511,010.2571
MENOS:					
AMORTIZACION DEL AVANCE	20%		RDS500,910.59	RDS320,126.14	RDS821,036.73
Porcentaje de avance	55%				
TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02			RDS2,003,642.34	RDS1,686,331.19	RDS3,689,973.53

PREPARADO POR:

ING. ELISMER GARCÍA MERCADO
ANALISTA DE COSTO

REVISADO POR:

ING. JUAN MIGUEL CASTAÑEDA
ENC. DEPTO. INGENIERÍA Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS



CONTRATISTA:

JOHANNA JOSE SILVERIO DE LEON
NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS SRL


APROBADO POR:

TOMAS EMILIO DURÁN GARDÉN
DIRECTOR GENERAL



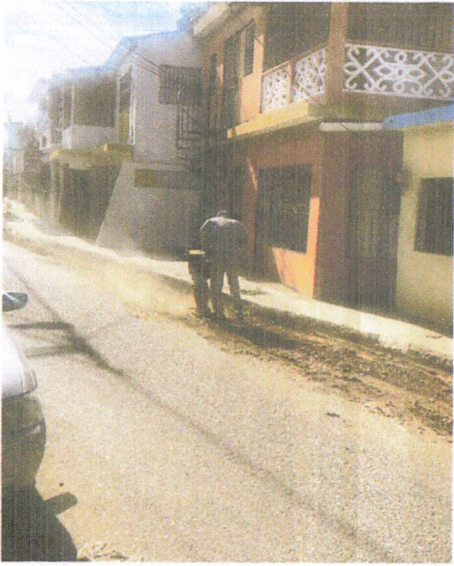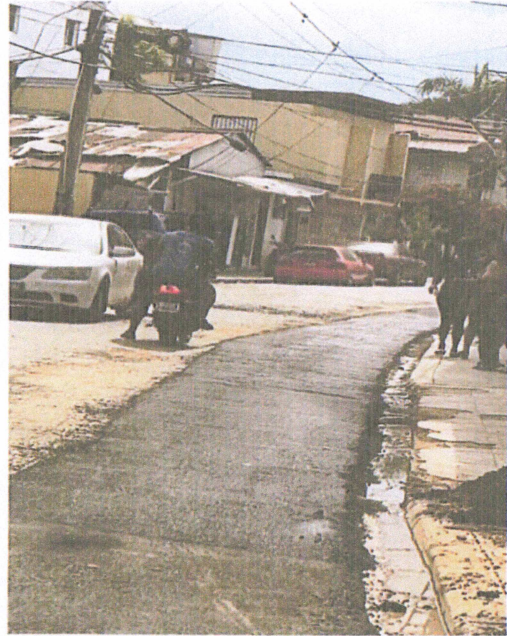



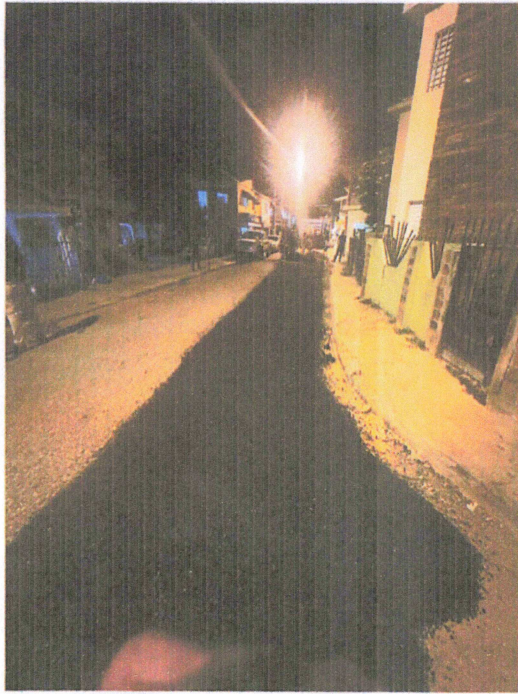





**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

A LA: Licda. Diana Polanco
Enc. División de Contabilidad

VIA: Lcdo. Tomas Emilio Duran Garden
Director General

Licdo. Melvin Gomez Burgos
Director Administrativo y Financiero

DEL: Departamento De Ingeniería y Fiscalización de Obras

ASUNTO: SOLICITUD PAGO

ANEXO: Cubicación, Copia Contrato, Presupuesto, fotos y Cheque



Por medio de la presente, solicitamos el pago de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS DOMINICANOS CON 59/100 CENTAVOS (RD\$887,370.59)**, a favor de **QUACON SRL**.

Este valor corresponde al reporte de la CUBICACION NO. 03 por concepto de **AMPLIACION LINEA DE AGUA RESIDUALES CAMINO LOS LLIBRE, SOSUA, PUERTO PLATA., Provincia Puerto Plata.,** según contrato No. 008/2022.

Sin otro particular para su conocimiento y fines de lugar.

Muy Atentamente,

Juan Miguel Castillo R.
Enc. Ingeniería y Fiscalización
de Obras
CODIA No. 24960

Ing. Juan Miguel Castillo Rodriguez
Enc. Depto. De Ingeniería y Fiscalización de Obras



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPLATA"

Pág. 01/03

OBRAS: AMPLIACION AGUA RESIDUALES CAMINO LOS LLIBRE, SOSUA

CUBICACION NO.: 3

FECHA DE REALIZACION: SEPTIEMBRE 12, 2025

CONTRATISTA: QUACON, S.R.L

MONTO CONTRATADO	RDS12,094,531.73
MONTO EQUILIBRIO	RDS3,857,369.24
MONTO AVANCE	RDS2,418,906.35
NO. CONTRATO	008/2022

CODIGO	PARTIDAS PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P. U. RDS	TOTAL	CANTIDADES				COSTOS RDS		
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
A	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO												
1.00		REPLANTEO (CON TOPOGRAFO)	ML	780.00	60.00	46,800.00	780.00	-	780.00	100.00%	46,800.00		46,800.00
1.02		MANEJO DEL TRNASITO	PA	1.00	100,000.00	100,000.00	0.90	0.10	1.00	100.00%	90,000.00	10,000.00	100,000.00
1.03		LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA	PA	1.00	85,000.00	85,000.00	0.47	0.12	0.59	58.82%	40,000.00	10,000.00	50,000.00
		SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO				231,800.00					176,800.00	20,000.00	196,800.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA												
2.01		EXCAVACION CON EQUIPO	M3	861.90	995.14	857,710.73	221.42	13.36	234.78	27.24%	220,341.74	13,293.54	233,635.278
2.02		ASIENTO DE ARENA DE 10 CM	M3	69.62	2774.67	193,172.29	62.85	-	62.85	90.27%	174,374.89		174,374.890
2.03		BOTE DE MATERIAL	M3	142.00	863.76	122,653.92	61.39	6.41	67.80	47.75%	53,029.20	5,534.20	58,563.397
2.04		RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION	M3	752.67	450.47	339,055.56	108.04	16.81	124.85	16.59%	48,670.81	7,570.83	56,241.644
		SUBTOTAL				1,312,592.50					496,416.64	26,398.57	522,815.21
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE												
3.01		TUBERIA PVC-SDR 26 12" +5% POR CAMP	ML	819.000	9,868.15	8,082,014.85	677.06	15.23	692.30	84.53%	6,681,352.00	150,330.42	6,831,682.42
		SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOC				8,082,014.85					6,681,352.00	150,330.42	6,831,682.42
4.00	ASFALTO-TODO COSTO												
4.01		CORTE DE ASFALTO CON MAQUINA (E=4") AMBOS LADOS	ML	1,576.000	360.88	568,740.10	1,309.67	-	1309.67	83.10%	472,634.12	-	472,634.12
4.02		RIEGO DE ADHERENCIA	M2	667.000	45.00	30,015.00	148.22	144.00	292.22	43.81%	6,670.00	6,480.00	13,150.00
4.03		SUMINISTRO DE HORMIGON EN CALIENTE EN PLANTA	M3	66.700	16,437.25	1,096,364.58	19.48	18.69	38.17	57.22%	320,160.00	307,200.00	627,360.00
4.04		COLOCACION CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE -TODO COSTO 4 PULG	M3	66.700	16,437.25	1,096,364.58	25.57	24.53	50.10	75.12%	420,288.91	403,275.72	823,564.63
		SUBTOTAL				2,791,484.26					1,219,753.03	716,955.72	1,936,708.75
5.00	CONFECCION REGISTROS 1@2 MTS CADA 100 ML												
5.01		REGISTRO FABRICADOS A MANO	UND.	9.00	45,865.60	412,790.40	7.35	-	7.35	81.64%	336,996.90		336,996.90
		SUBTOTAL CONFECCION				412,790.40					336,996.90		336,996.90
6.00	EMPALME A RED PRINCIPAL EN CARRETERA PUERTO PLATA/SOSUA												

HTT

6.01	PICADO DE CALLE, CONEXIÓN A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTRO Y CALLE	PA	1.00	85,000.00	85,000.00	1.00	-	1.00	100.00%	85,000.00		85,000.00
6.02	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	26.40	271.30	7,162.23	26.40	-	26.40	100.00%			
6.03	ASIENTO DE GRAVA DE 10 CM	M3	1.70	2,721.02	4,625.73	1.44	-	1.44	84.55%	3,911.13		3,911.13
6.04	BOTE DE MATERIAL	M3	2.21	863.76	1,908.91	1.06	-	1.06	47.81%	912.73		912.73
6.05	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION	M3	23.47	450.47	10,572.53	3.89	-	3.89	16.59%	1,754.07		1,754.07
	SUBTOTAL				109,269.41					918,734		918,734
A	SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO				13,139,951.38					9,002,896.50	913,684.71	9,916,581.21

ETM



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"

OBRA: AMPLIACION AGUA RESIDUALES CAMINO LOS LLIBRE, SOSUA

CUBICACION NO.: 3

DE REALIZACION: SEPTIEMBRE 12, 2025

CONTRATISTA: QUACON, S.R.L

MONTO CONTRATADO:	RDS12,094,531.73
MONTO EQUILIBRIO	RDS3,857,369.24
MONTO AVANCE:	RDS2,418,906.35
NO. CONTRATO:	008/2022

	PRESUPUESTO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO	13,139,951.38	9,002,896.50	913,684.71	9,916,581.21

SUB-TOTAL GENERAL

MAS:

GASTOS INDIRECTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.50%	RDS459,898.298	RDS315,101.378	RDS31,978.9648	RDS347,080.342
HONORARIOS PROFESIONALES	10%	RDS1,313,995.138	RDS900,289.650	RDS91,368.471	RDS991,658.121
ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES	18%	RDS236,519.125	RDS162,052.137	RDS16,446.32	RDS178,498.462
SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS	3.00%	RDS394,198.541	RDS270,086.895	RDS27,410.5412	RDS297,497.436
TRANSPORTE	2.0%	RDS262,799.028	RDS180,057.930	RDS18,273.6941	RDS198,331.624
LEY 6/86	1%	RDS131,399.514	RDS90,028.965	RDS9,136.85	RDS99,165.812
CODIA	0.1%	RDS13,139.951	RDS9,002.897	RDS913.68	RDS9,916.581

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RDS2,811,949.60	RDS1,926,619.851	RDS195,528.527	RDS2,122,148.378
------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

TOTAL GENERAL	RDS15,951,900.98
----------------------	-------------------------

SUB-TOTAL CUBICADO	RDS10,929,516.351	RDS1,109,213.23	RDS12,038,729.586
---------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

MEJOS:

AMORTIZACION DEL AVANCE	20%	RDS2,185,903.270	RDS221,842.647	RDS2,407,745.917
PORCENTAJE DE EJECUCION	75.5%			

TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02	RDS8,743,613.081	RDS887,370.59	RDS9,630,983.669
---------------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

REVISADO POR:

JUAN MIGUEL CASTILLO RODRIGUEZ

ENC. DEPTO. DE INGENIERIA Y FISCALIZACION DE OBRAS



CONTRATISTA:

LUIS TOMAS MATA MARTINEZ
QUACON, S.R.L
